

EL BLUEPRINT DEL PROYECTO IA

Guía táctica para implantar Inteligencia Artificial en la empresa real en 90 días.



Metodología, Arquitectura y Evaluación.




Cofinanciado por
la Unión Europea



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL



Fondos Europeos



Castilla-La Mancha



fedeto
Federación de Centros de la provincia de Toledo
CZOE CEPYME

La Filosofía del Proyecto



Un Proyecto Válido ES:



- Un problema real de negocio con impacto medible.



- Un caso de uso acotado con usuarios definidos.



- Un Minimum Viable Project (MVP) usable.



- Pruebas documentadas con datos reales.



- Un plan de operación y adopción.



Un Proyecto Válido NO ES:



- Una investigación teórica generalista.



- Un listado de herramientas o prompts sueltos.



- Un prototipo sin usuarios ni pruebas.



- Un documento sin hoja de ruta técnica.

REGLA DE ORO: Si algo no se puede medir, probar o demostrar con evidencia, todavía no está bien definido.

El Mapa del Proyecto: Ciclo de Vida en 6 Fases



Este blueprint garantiza que ninguna fase técnica comience sin la validación del negocio.

Fase 1: El Arte del Diagnóstico



La Fórmula del Problem Statement

$$\begin{aligned} & \text{[ROL]} + \text{[TAREA]} + \text{[DOLOR]} = \\ & + \text{[MÉTRICA]} + \text{[CONDICIÓN]} = \end{aligned}$$

Ejemplo de aplicación: El equipo de soporte **[ROL]** dedica 10 min a clasificar tickets **[TAREA]**, generando colas **[DOLOR]**.

Objetivo: reducir a 6 min **[MÉTRICA]** sin perder precisión **[CONDICIÓN]**.

Fase 1: Taxonomía de Oportunidades IA

Busca tareas resolubles, no herramientas genéricas.



1. Redacción

Emails, propuestas, y respuestas estandarizadas.




2. Síntesis

Resumen de informes largos, reuniones o tickets.



3. Extracción

De texto libre (ej. PDF) a formato estructurado (JSON/Tabla).

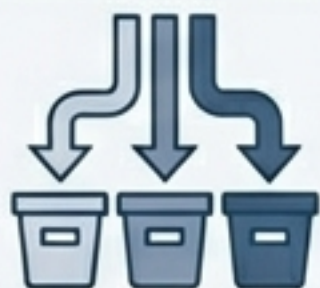

4. Clasificación

Etiquetado, priorización y enrutado automático de peticiones.



5. Búsqueda (Q&A)

Respuestas basadas exclusivamente en manuales y procedimientos internos.



6. Predicción

Scoring, riesgo y previsión de demanda (requiere datos históricos estructurados).

Fase 2: Priorización y Selección



Banderas Rojas (Casos Trampa)

- Dependencia crítica de IT para arrancar.
- Decisiones de alto riesgo operando sin supervisión humana.
- Datos inaccesibles, bloqueados o inexistentes.

Fase 2: El Plan de Proyecto Mínimo Viable (MPV)

El contrato innegociable antes de construir.

Límites del Alcance

INCLUYE:

- Tareas acotadas, usuarios definidos, MVP usable.

FUERA DE ALCANCE:

- Integraciones complejas, automatización total sin revisión.

Definición de KPIs (Umbrales)



Tiempo: Reducción del 40% en tiempo medio de resolución.



Calidad: 60% de las respuestas aprobadas sin requerir cambios humanos.



Adopción: 0 incidentes de datos; tasa de uso semanal documentada.

Matriz de Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación Concreta	Responsable
Alucinación LLM	 Alto	 Restricciones de prompt + Validación humana obligatoria	 Owner del Proceso

Fase 3: Disponibilidad de Datos (Data Readiness)


Diagnóstico dashboard



VERDE: Datos accesibles, relevantes, suficientes y anonimizables. ¡Piloto listo para iniciar!



AMARILLO: Los datos existen, pero requieren extracción manual, limpieza o permisos. Usable con fricción.

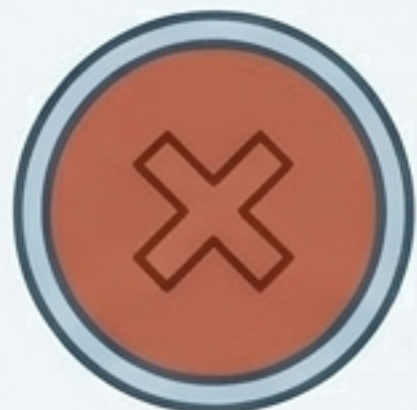

ROJO: Datos inaccesibles, estrictamente confidenciales o desactualizados. Inviabile. Peligro.


Dataset Mínimo Viable (DMV)

No necesitas Big Data. Necesitas 20-50 casos altamente representativos.


60%
Casos
Típicos

30%
Casos
Variados

10%
Casos Difíciles
/ Excepciones

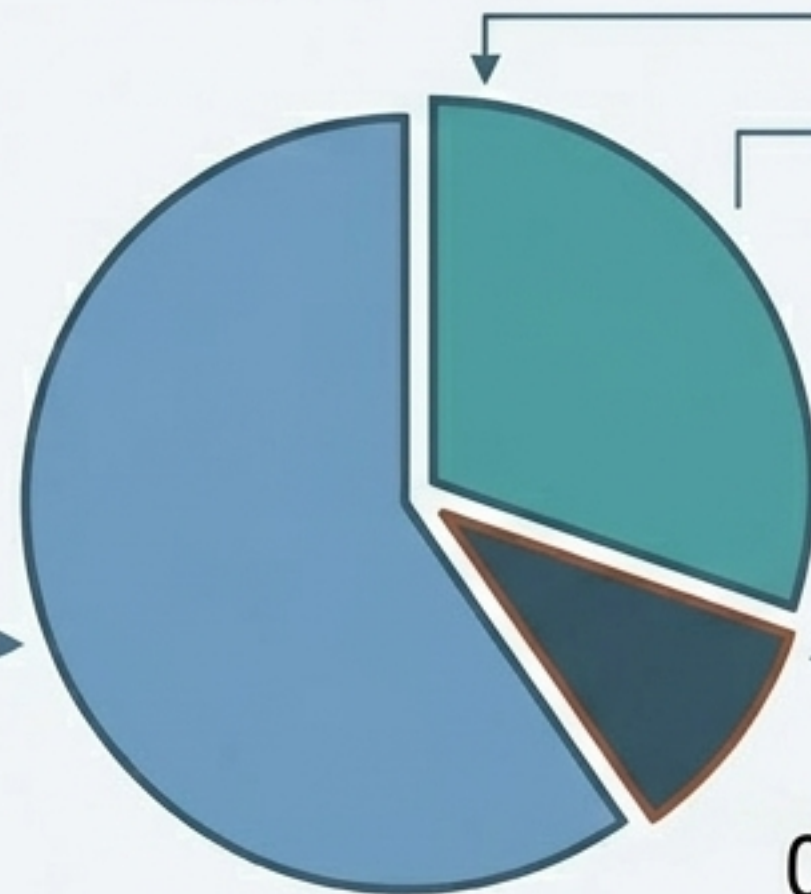

Fase 3: El Filtro de Privacidad

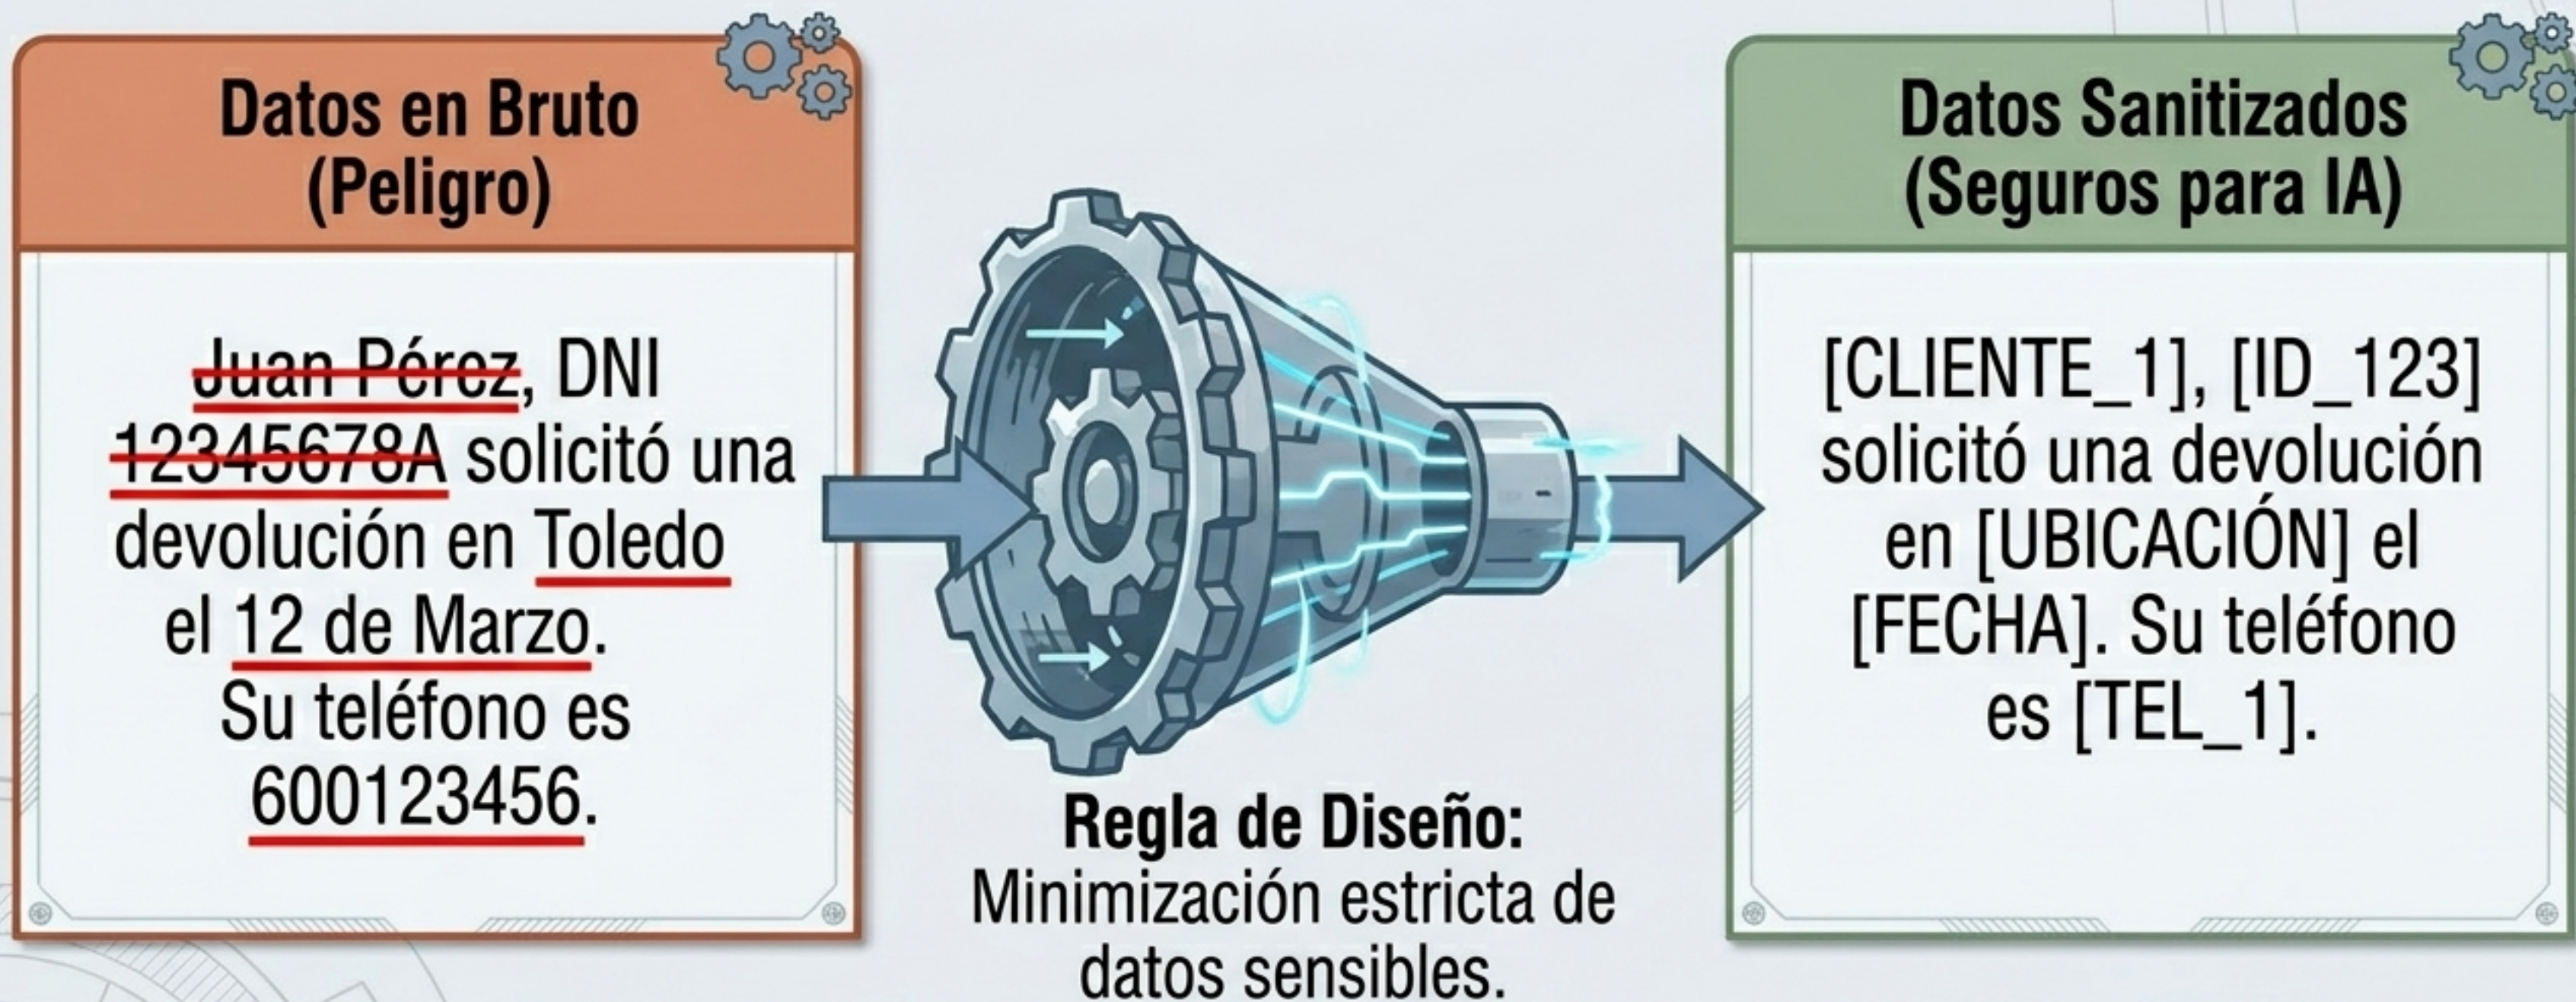

La privacidad es una restricción de diseño desde el día 1. Nunca se envían datos corporativos reales a un LLM público sin enmascaramiento.

Fase 4: Matriz de Decisión Arquitectónica

Elige la solución más simple que resuelva el problema operativo.

Criterios de Decisión	Prompting / Asistentes	Automatización (Make/n8n)	RAG (Búsqueda Documental)	Analítica Predictiva
Casos de Uso	Bajo esfuerzo, revisión directa	Flujos repetitivos con triggers	Respuestas con fuentes internas	Previsiones basadas en histórico
Volumen de Datos Necesario	Bajo	Medio	Alto (Base Documental)	Muy Alto (Estructurado)
Trazabilidad del Proceso	Baja/Manual	Alta (Logs y Registros)	Estricta (Citas de origen)	Estadística
Velocidad de Implantación	Días	Semanas	Semanas/Meses	Meses


Fase 4: Diseñando el Sistema T0-BE




Todo diseño empresarial auditable depende de este nodo de supervisión.

Fase 5 y 6: Validación y Hoja de Ruta Temporal

El Piloto (Velocidad de Implantación)

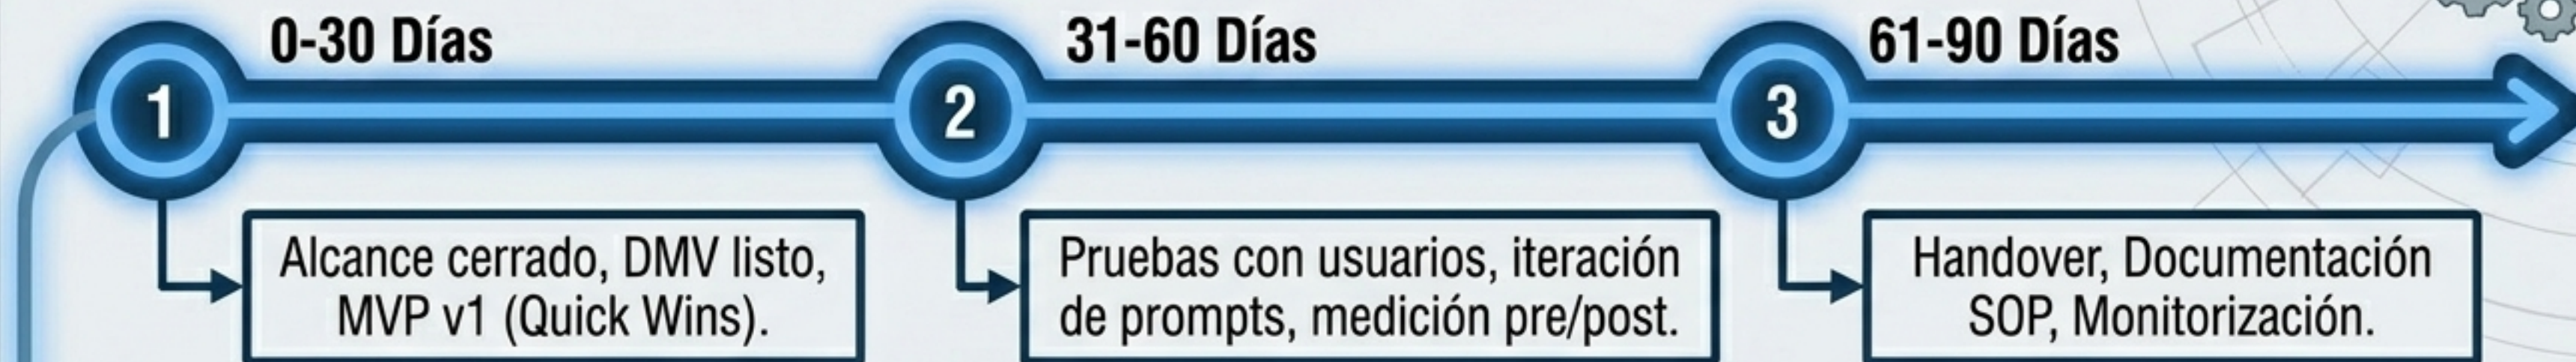

El Escalado (Velocidad de Gobernanza)

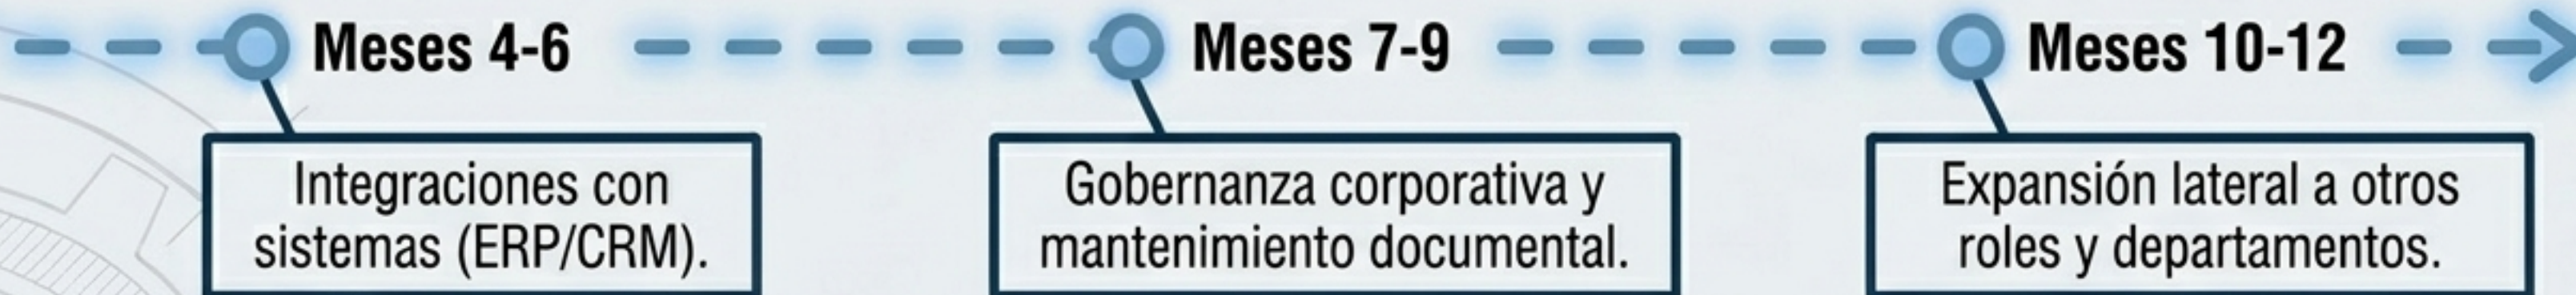

ADVERTENCIA DE ADOPCIÓN: Sin un Procedimiento Operativo (SOP), formación y un 'Owner' interno asignado, el piloto **muere el día 91**.

El Valor para la Empresa Anfitriona

Entregables Corporativos (Win-Win)

Diagnóstico Real

Mapa AS-IS y detección de cuellos de botella operativos reales, basados en datos.

MVPs Funcionales

Prototipos listos (Prompts, flujos Make/n8n) testeados internamente con datos propios.

Hoja de Ruta

Plan táctico, validado y auditable, para escalar la gradualmente a 12 meses.

Captación de Talento

Identificación de perfiles jóvenes altamente capacitados en IA sin riesgo operativo para la empresa.

90 horas de dedicación experta transformadas en una puerta de entrada segura y metodológica a la Inteligencia Artificial.



Evaluación Documental (0-10 Puntos)

- ☐ Resumen Ejecutivo y mapeo del Contexto AS-IS.
- ☐ Alcance estrictamente acotado y KPIs definidos con umbral.
- ☐ Diseño riguroso de Arquitectura y flujo TO-BE.
- ☐ Matriz de Riesgos documentada y estrategia de privacidad.



Evaluación Oral (0-10 Puntos)

- ☐ Storytelling: Claridad narrativa e impacto en el negocio.
- ☐ Demostración práctica del flujo y del MVP.
- ☐ Calidad de soportes visuales y gestión estricta del tiempo (7-10 min).
- ☐ Defensa técnica de la solución y reconocimiento honesto de sus límites.



Checklist Final de Realismo (Go / No-Go)



Strategic Blueprint

- [] ¿El proceso operativo actual se puede explicar claramente en menos de 8 pasos?**
- [] ¿Existen al menos 20 casos de prueba reales y están debidamente anonimizados?**
- [] ¿Se han definido KPIs de negocio con un umbral de éxito cuantificable?**
- [] ¿Hay al menos un Minimum Viable Project (MVP) listo y testeable?**
- [] ¿Existe una mitigación clara, documentada y asignada para los riesgos de privacidad y alucinación?**

“La Inteligencia Artificial en la empresa se valida por la creación de valor y su adopción real por los usuarios, nunca simplemente por el hecho de utilizar tecnología.”
